Exploitation du Chauffage Urbain MONS ENERGIE

Année 2013

Données	2013	2012	2011	2010
Quantité de chaleur vendue	70 197	63 591	57 364	73 008
Quantité de chaleur distribuée	73 397	66 573	58 985	73 768
pertes réseaux	4.36%	4,48%	2,75%	1,03%
DJU (moyen)	2 703	2 512	2 254	2 916
rendement cogénération	80.0%	77,80%	80,30%	80,40%

La fourniture de chaleur a été assurée toute l'année.

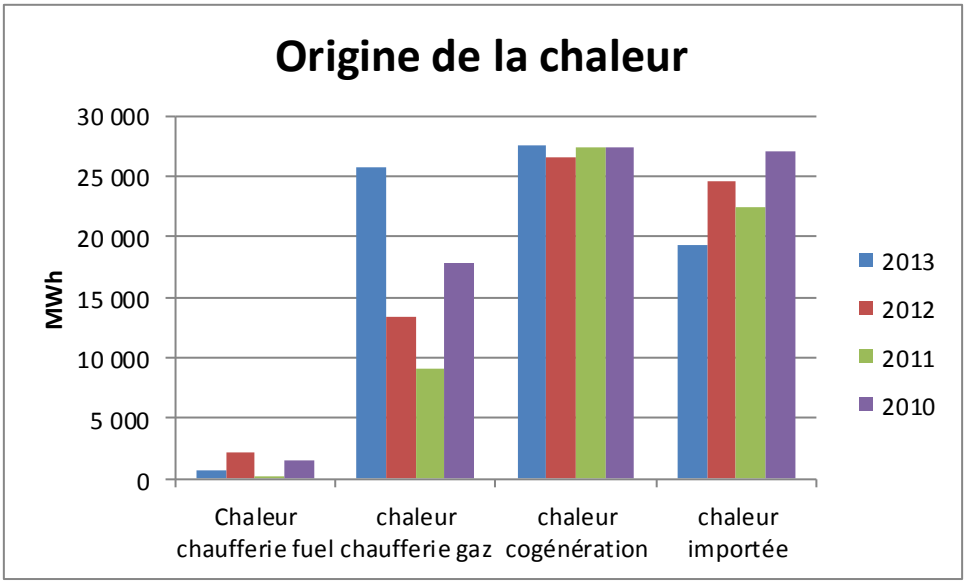

TARIFS

MONS ENERGIE - EXCERCICE 2013

PRIX LICITES HT	BASE 01/10/2001	janvier 2013	février 2013	mars 2013	avril 2013	mai 2013	juin 2013	juillet 2013	août 2013	septembre 2013	octobre 2013	novembre 2013	décembre 2013
REDEVANCE PROPORTIONNELLE R1 (€/MWH)	**23,920**	**45,465**	**45,417**	**45,381**	**44,220**	**44,242**	**43,885**	**43,791**	**43,815**	**43,801**	**46,240**	**46,234**	**46,238**
REDEVANCE FIXE R2 (€/KW)	22,110	25,964	26,024	26,055	26,115	26,182	26,062	25,991	25,967	26,033	26,134	26,150	26,140

Prix moyen	2013	2012	2011	2010	2009	2008
R1 (€ / Mwh)	44,80	43,46	40,99	37,16	36,7	38,56
R2 (€ / KW)	26,07	25,83	25,07	24,52	24,15	24,33

Application du plafonnement gaz mis en place dans l'avenant 1 suite à l'évolution des coûts du R1 et du R2 Résonor.

EVOLUTIONS

Etablissement du permis de construire et du dossier d'autorisation d'exploiter en vue de la construction de la chaufferie biomasse, rue de Normandie comme approuvé par le conseil municipal dans l'avenant numéro un en 2014

Des nouvelles polices ont été signées :
* Mendes France (PS = 100kW
* Vilogia C6A (PS = 175 kW)
* Vilogia C6B (PS = 250 kW)

Un avenant a été validé, avec modification des puissances souscrites pour le groupe scolaire Provinces suite à la reconstruction du gymnase.

Des raccordements sont prévus pour 2014 :

- Vilogia C7
- Nexity Trocadero
- Pépite
- C2 Sud
- C2 Nord

TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT

Code H	Nature de Travaux	Total Dépenses sur H
HS28PFF	SST 6906 - 2 JEUX DE 121 PLAQUES V28NETTOYAGE, RESSUAGE, REJOINTAGE, JOINTS NEUFS	-2 886
HS2CBBC	TRAVAUX PASSAGE DECENNALE CHAUDIERE N4 - HPRELANCE RESONOR	16 290
HS2CQNK	RECONDITIONNEMENT PLAQUES ECHANGEURS V28TETE DE RESEAU	3 333
HS2FMZH	EVOLUTION ET PASSAGE DE LA BOUCLE GTC EN IPGESTION TECHNIQUE CENTRALISEE	7 204
HS2GKGK	REPARATION PPE DE RELANCE SUR RESONORCHAUDIERE HP N.4	4 224
HS2GKHL	REPARATION PPE RECYCLAGE CHAUDIERE BP N.3	3 004
Total		**31 170 €**

QUOTAS CO2

Bilan des quotas CO2	2013	2012	2011	2010	2009
Emission réelle (en tonnes)	19 601	17 430	15 333	17 804	15 200
